

Druk Nr 7 / LVII

Sprawozdanie z realizacji inwestycji gminnych za rok 2023


Załącznik nr 1. Inwestycje gminnych za rok 2023				
Lp.	Opis	Finasowanie ze	Przyznane	Wartość zadania
		środków własnych Gminy	dofinansowanie / źródło finansowania	
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna				
	Przebudowa ujęć wody w Górzycy wraz z przebudową wodociągu w miejscowości Owczary i uszczelnieniem sieci kanalizacyjnej w miejscowości Górzycza Inwestycja zaplanowana na lata 2023-2024. Catkowita wartość inwestycji wyniesie 5 093 896,18 zł, z czego dofinansowanie w kwocie 4 839 201,37 zł z Funduszu Polski Ład i składa się dwóch zadań. Pierwsza inwestycja obejmuje kompleksową modernizację studni głębinowych obsługujących SUW w m. Górzycza, budowę sieci wodociągowej z m. Górzycza do m. Owczary wraz siecią rozdzielczą w m. Owczary o długości około 1,8 km oraz zbiornikiem zapasowo-wyrównawczym o pojemności 50,0 m³. Wartość zadania wyniesie 2 461 000,00 zł. Drugim zadaniem jest bezwykopowe uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Górzycza – ulica Reja, Ogrodowa, Osiedle Kwiatowe o łącznej długości 1010,0 mb, w tym 30 studni i 17 przyłączy. W ramach inwestycji zostanie również zakupiony specjalistyczny pojazd typu WUKO do utrzymania sieci kanalizacyjnej. Catkowita wartość zadania wynosi 2 632 896,18 zł. W roku sprawozdawczym wykonano renowację sieci kanalizacyjnej oraz modernizację ujęć wody. Przystąpiono także do projektowania sieci wodociągowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń. Catkowity koszt wykonanych robót w roku 2023 wyniósł 2 700 295,48 zł Wykonawca robót: 1) związanych z siecią wodociągową – Wodam Sp. z o.o. 2) związanych z siecią kanalizacyjną – Cons Control System Sp. z o.o.	254 694,81 zł	2 419 600,68 zł	2 674 295,49 zł
			Rządowy Fundusz Polski Ład – Program inwestycji strategicznych (90 % wartości zadania)	

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej o długości 100,00 mb na ulicy Jarzębinowej w Górzycy. Jest to kontynuacja prac prowadzonych na powstającym osiedlu mieszkalnym. Całkowita długość planowanej sieci wodno-kanalizacyjnej wynosi około 800,00 mb z czego wykonano już 750,0 mb sieci wodociągowej i 700,00 mb kanalizacji sanitarnej.	57 866,53 zł		57 866,53 zł
Razem infrastruktura wodno-kanalizacyjna	312 561,34 zł	2 419 600,68 zł	2 732 162,02 zł
Infrastruktura drogowa			
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czarnów – ulica Mickiewicza i Krótka Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czarnów – ulica Mickiewicza i Krótka o łącznej długości 660,0 mb. Przebudowa obejmowała drogi o powierzchni 3492,00 m ² (nawierzchnia z kostki betonowej), zjazdy, chodnik, próg zwalniający, oznakowanie pionowe. Wykonawcą robót była firma Terbud Czesław Kotliński.	80 000,00 zł	1 520 000,00 zł	1 600 000,00 zł
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żabice – ulica 1 Maja Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap o długości około 750,00 mb obejmujący przebudowę ulicy Mickiewicza i Spokojnej został zrealizowany w 2022r. W roku 2023 zrealizowano drugi etap - ulicę 1 Maja, odcinek o długości 420,0 mb. Przebudowa obejmowała wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m, chodniki o szerokości 2,0 m, wyniesione skrzyżowania pełniące funkcje spowalniania ruchu, progi zwalniające i oznakowanie pionowe. Przebudowano także napowietrzną sieć elektryczną, ze względu na kolizję słupów z planowanymi chodnikami. Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie	566 278,22 zł	358 741,00 zł	925 019,22 zł

	1 223 250,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosił 2 534 030,26 zł. Wykonawcą robót była firma Terbud Czesław Kotliński.			
	Budowa ulicy Różanej w miejscowości Górzycza	74 218,21 zł	1 410 145,97 zł	1 484 364,18 zł
	Budowa drogi o długości około 490,0 m wraz z zjazdami i miejscami parkingowymi oraz chodników o długości około 230,0 m. Jest to ostatni element procesu uzbrojenia technicznego osiedla mieszkalnego. Całkowita wartość zadania wynosi 1 484 364,18 zł, w tym dofinansowanie stanowi 1 410 145,97 zł. Zakończenie prac było planowane do końca 2023r., jednak ze względu na konieczność dokonania zmian w projekcie budowlanym i uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, termin zakończenia prac został wydłużony do końca lutego 2024r. Do wykonania została jeszcze część zjazdów, chodnik łączący ulicę Jaśminową z ulicą Wolności oraz uporządkowanie terenu co stanowi około 10 % zakresu robót. Wykonawcą robót jest firma Terbud Czesław Kotliński		Rządowy Fundusz Polski ład – Program inwestycji strategicznych (95 % wartości zadania)	
	Razem Infrastruktura drogowa	720 496,43 zł	3 288 886,97 zł	4 009 383,40 zł
	Infrastruktura sportowo-rekreacyjna			
	Zakup wyposażenia placów zabaw w miejscowości Żabice, Górzycza	18 000,00 zł	-	18 000,00 zł
	Remonty świetlic wiejskich	189 617,45 zł	-	189 617,45 zł
	1) wykonanie elewacji i monitoringu OSP w Czarnowie – 54 510,04 zł, 2) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Pamięcinie – 18 576,65 zł, 3) remont zaplecza kuchennego w Stańsku – 18 000,00 zł, 4) termomodernizacja budynku w Laskach Lubuskich – 17 280,00 zł, 5) przebudowa dachu budynku w Żabicach (zakres wykonanych robót w 2023r. wynosi około 70%) – 81 250,76 zł			

Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Górzycy Budowa została zakończona w grudniu, obecnie trwają prace odbiorowe. Zakres robót obejmował budowę sali spotkań, szatni, pomieszczenia sanitarnego, biurowego gospodarczego oraz kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 272,0 m². Dodatkowo wymieniono także bramy wjazdowe. Ta część inwestycji została dofinansowana ze środków Funduszu Polski Ład w wysokości 1 810 336,90 zł. Pozyskano także 27 500,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na modernizację pomieszczeń garażowych OSP, w tym wymianę instalacji elektrycznej oraz prace malarskie. Budowa zrealizowana przez firmę P.K BudWest Sp. z o.o.	39 445,65 zł	1 810 336,90 zł	1 877 282,55 zł
Razem infrastruktura sportowo-rekreacyjna	247 063,10 zł	1 837 836,90 zł	2 084 900,00 zł
Infrastruktura oświatowa			
Budowa budynku szkolno-przedszkolnego w miejscowości Czarnów Budowę rozpoczęto w 2022r. Wykonano wtedy budynek w stanie surowym otwartym. W roku 2023 prowadzono dalsze prace budowlane i wykończeniowe. Pozwolenie na użytkowanie zostało uzyskane w dniu 25 sierpnia 2023r. Obiekt posiada 300,0 m² powierzchni użytkowej, w tym trzy sale edukacyjne, szatnie, pokój dla nauczycieli oraz pomieszczenia gospodarcze. Inwestycja została dofinansowana z dwóch edycji naborów środków w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o łącznej wartości 2 100 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 101 883,83 zł. Budowa zrealizowana przez firmę Bau-Bud Patryk Dłużewski.	1 001 883,83 zł	940 336,98 zł	1 942 220,81 zł
Razem Infrastruktura oświatowa	1 001 883,83 zł	940 336,98 zł	1 942 220,81 zł
Razem rok 2023	2 282 004,70 zł	8 486 661,53 zł	10 768 666,23 zł

Wydatki inwestycyjne Gminy Górzycza w latach 2013-2023

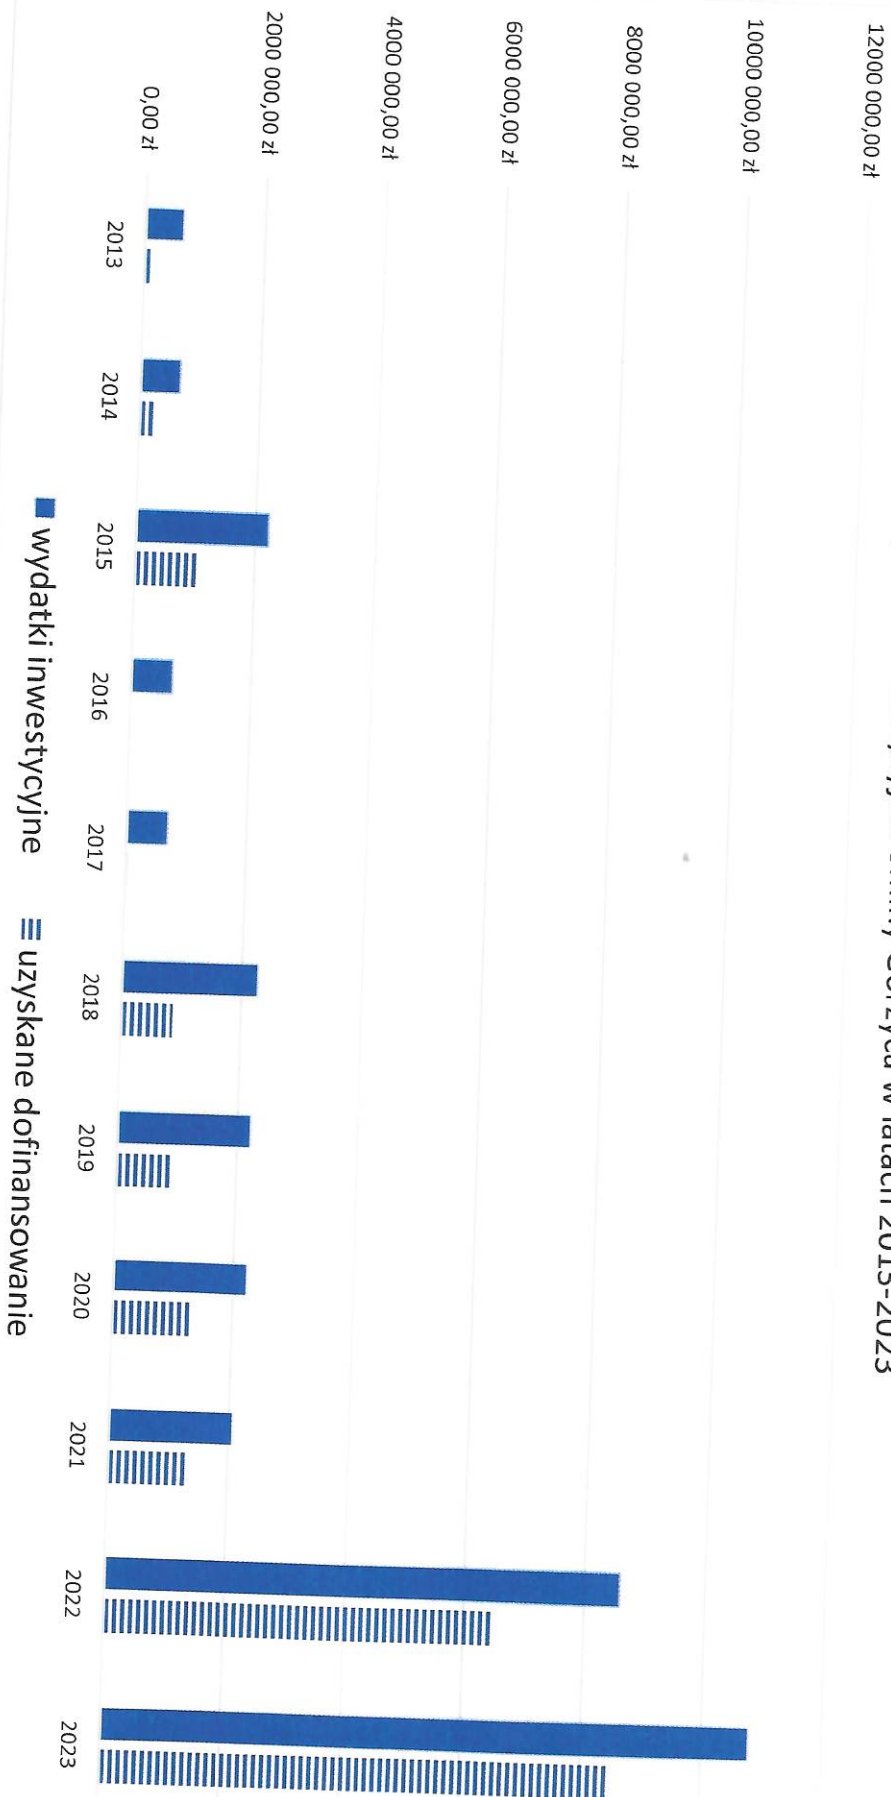

2023
